

**ČASŤ 1
ZMLUVA O DIELO**

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: 1273/2410/2026
evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet

„I/18 Kral'ovany – most 315, oprava odvodnenia a predĺženie zostatkovej životnosti mosta do doby dostavby diaľnice D1“
(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1. Objednávateľ

Sídlo:	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán:	Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
IČO:	000 033 28
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259

Telefón: +421 41 507 4612

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - vo veciach zmluvných: | PhDr. Ivan Brečka MBA – riaditeľ SSC IVSC Žilina |
| - vo veciach technických: | Ing. Vladimír Veveričík - námestník ÚIV SSC IVSC Žilina. |
| - vo veciach realizačných: | Ing. Vladimír Veveričík - námestník ÚIV SSC IVSC Žilina |
| - kontroly kvality materiálov a prác: | Ing. Ružena Moravčíková, PhD - vedúca OKK a S SSC IVSC Žilina. |

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M 95 zo dňa 07.12.1995

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva, Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva, Mgr. Lenka Šimková, členka predstavenstva

Bankové spojenie: : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: SK31 1111 0000 0066 2407 2325

IČO: 31 651 518

IČ DPH: SK2020490274

Tel.: 0908 714 098

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED
- vo veciach technických: Ing. Tibor Kubáň, obchodno technický námestník
- vo veciach realizačných: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED

Právna forma: akciová spoločnosť

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania
(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list (Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia ponúk, časť 1.5 Prílohy a formuláre, Zväzok 1 súťažných podkladov tak, ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)
 - (c) Príloha k ponuke
(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (d) Osobitné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (e) Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (f) Technické špecifikácie
(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom USB kľúči)
 - (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom USB Kľúči)
 - (h) Cenová časť
(Zväzok 4 súťažných podkladov)
 - (i) Ponuka Zhotoviteľa
(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (j) Vzorové tlačivá
(Zväzok 2 Časť 4¹ až 14 súťažných podkladov)
 - (k) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené v profile zákazky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie uvo.gov.sk. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.

¹ Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby.

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.
2. Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní.
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „I/18 Kraľovany – most 315, oprava odvodnenia a predĺženie zostatkovej životnosti mosta do doby dostavby diaľnice D1“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru alebo faktúry a zaslať ich objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu efaktury@ssc.sk. Faktúra bude doručená v elektronickej forme vo formáte PDF. Lehota splatnosti každej faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa efaktury@ssc.sk, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený na faktúre, ktorý musí zodpovedať bankovému účtu zhotoviteľa uvedenému v záhlaví zmluvy. Zmluvné strany súhlasia s elektronickým zasielaním faktúr.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH.....698 496,76 EUR
DPH 23%160 654,25 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH.....859 151,01 EUR
(slovom Osemstopäťdesiatdeväťtisícjednostopäťdesiatjeden a 1/100 EUR)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.
10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na predmet zákazky „I/18 Kraľovany – most 315, oprava odvodnenia a predĺženie zostatkovej životnosti mosta do doby dostavby diaľnice D1“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Všeobecných Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v *šiestich* rovnopisoch, z ktorých *štyri* obdrží Objednávateľ a *dva* Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá Objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť deň potom, ako bude Zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie Objednávateľa (SSC) o tom, že Objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy a zároveň Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi svoju pripravenosť zahájiť plnenie v zmysle Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi svoju pripravenosť na plnenie v zmysle Zmluvy, táto nadobúda účinnosť na 60 deň od doručenia oznámenia Objednávateľa.
Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadiť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:

- Príloha č. 1 Zoznam podzhotoviteľov a podiel subdodávok

- Príloha č. 2 Zoznam kľúčových a neklúčových odborníkov na stavbe
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa
 - časť 3.1 Vecný harmonogram
 - časť 3.2 Míľniky
 - časť 3.3 Fakturačný harmonogram
 - Príloha č. 4 Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok
 - Príloha č. 5 Protikorupčná doložka
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov je podmienené uzatvorením dodatku v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku
17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie.
20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítavať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Košiciach, dňa..... 17-08-2026

V, dňa.....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam podzhotoviteľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných podzhotoviteľov v členení:

- A/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok
 B/ Menovaní Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 a podčlánku 5.1 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Podzhotoviteľov)
 C/ Dodávatelia Zhotoviteľa

A/

p.č.	Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za podzhotoviteľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
Súhrn podielu subdodávok					0

B/

p.č.	Menovaní Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za podzhotoviteľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
Súhrn podielu subdodávok					0

C/

p.č.	Dodávatelia Zhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za podzhotoviteľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH

			Súhrn podielu subdodávok		0

17-08-2026

V Košiciach dňa

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových a neklúčových odborníkov na stavbe

Funkcia	Meno a priezvisko
Hlavný stavbyvedúci	Ing. Miloš Farkaš
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	Ing. Ján Sasák
Zodpovedný geodet	Ing. Svetozár Mocko
Koordinátor BOZP	Ing. Alžbeta Fedáková

17 -08- 2026

V Košiciach dňa

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniám - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

- Vecný harmonogram a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

časť 3.1 Vecný harmonogram

- tzv. Ganttov graf- grafická časť vypracovaná vo formáte *.pdf s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie.

časť 3.2 Míľniky

- Stavba neobsahuje míľniky.

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

- vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).

Q	Kód PO QIV	Název dílny	průměr číslo dílny	průměr číslo dílny	průměr číslo dílny
1		1718 Kódování - měří 315 - úprava odvodnění a předčištění čerpadlové jednotky mimo do dílny úpravy dle části D1			90 dní
2	HSV	Práce a dodávky HSV			00 dní
3		Zřízení a kompletní instalace			33 dní
4	317171121.5	Konstrukce vodotěsného základu (mimo do měřicího kódu do 10m)	m3	310.000	4 dní
5	317321118.5	Montáž dílny / základu / základy (mimo C 30-45)	m3	30.000	2 dní
6	317331211.5	Dokončení montáže (mimo výhledy ústředí - izolace)	m2	200.000	4 dní
7	317331221.5	Dokončení montáže (mimo výhledy ústředí - izolace)	m2	200.000	2 dní
8	317341214.5	Výhled montáže (mimo do měřicího kódu 1000)	l	0.000	4 dní
9		Vodotěsná konstrukce			7 dní
10	322311241.5	Montáž pravoúhlé betonové opory kotelny (mimo do měřicího kódu C 20-45)	m3	5.000	3 dní
11	345421128	Podkladová vrstva izolace	m3	13.250	2 dní
12	345431011.5	Podkladová vrstva izolace (mimo do měřicího kódu)	m3	1.250	2 dní
13		Komunikace			24 dní
14	322311021.5	Plnění stěnových otvorů (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m2	200.000	1 den
15	321421121.5	Úprava stěn / zděná izolace (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m2	200.000	1 den
16		Úprava stěn, podlahy, osazení			14 dní
17	322311031.5	Reparatura podlahy (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m2	500.000	14 dní
18		Osazení kotelny a pravoúhlé			63 dní
19	331441131.5	Osazení (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m	8.000	6 dní
20	331441141.5	Termální izolace (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m	240.000	8 dní
21	331441151.5	Osazení (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m	54.000	8 dní
22	345431111.5	Montáž (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m	240.000	6 dní
23	361031111.5	Montáž (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m3	97.100	5 dní
24	371030211.5	Montáž (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m	400.000	6 dní
25	371030211.5	Výhled (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m	54.000	5 dní
26		Práce a dodávky PSV			7 dní
27		Návrh			7 dní
28	371030211.5	Návrh (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m2	900.000	7 dní
29		Investiční náklady neobsluhovat v ceně			14 dní
30	371030211.5	Investiční náklady (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m3	1.000	12 dní
31	371030211.5	Investiční náklady (mimo do měřicího kódu 1.50 kg/m2)	m3	1.000	2 dní




Objekt	Názov úlohy	Trvanie	Cena Súťaž	mes 1	mes 2	mes 3	Σ 1-3
	PROJEKT "I/18 Kraľovany – most 315, oprava odvodnenia a predĺženie zostatkovej životnosti mosta do doby dostavby diaľnice D1"	90					
0	Most		698 496,76	123 650,00 €	248 700,00 €	326 146,76 €	0,00 €
	PREDPOKLADANÝ FAKTURAČNÝ TOK - MESAČNÝ		698 496,76	17,70%	35,61%	46,69%	0,00 €
	PREDPOKLADANÝ FAKTURAČNÝ TOK - %			123 650,00 €	372 350,00 €	698 496,76 €	
	PREDPOKLADANÝ FAKTURAČNÝ TOK - KUMULOVANÝ						

0,00 €
KONTROLA
0,00 €
698 496,76 €
100,00%
0,00 €


PROJEKT "Kraľovany most"

S-krivka

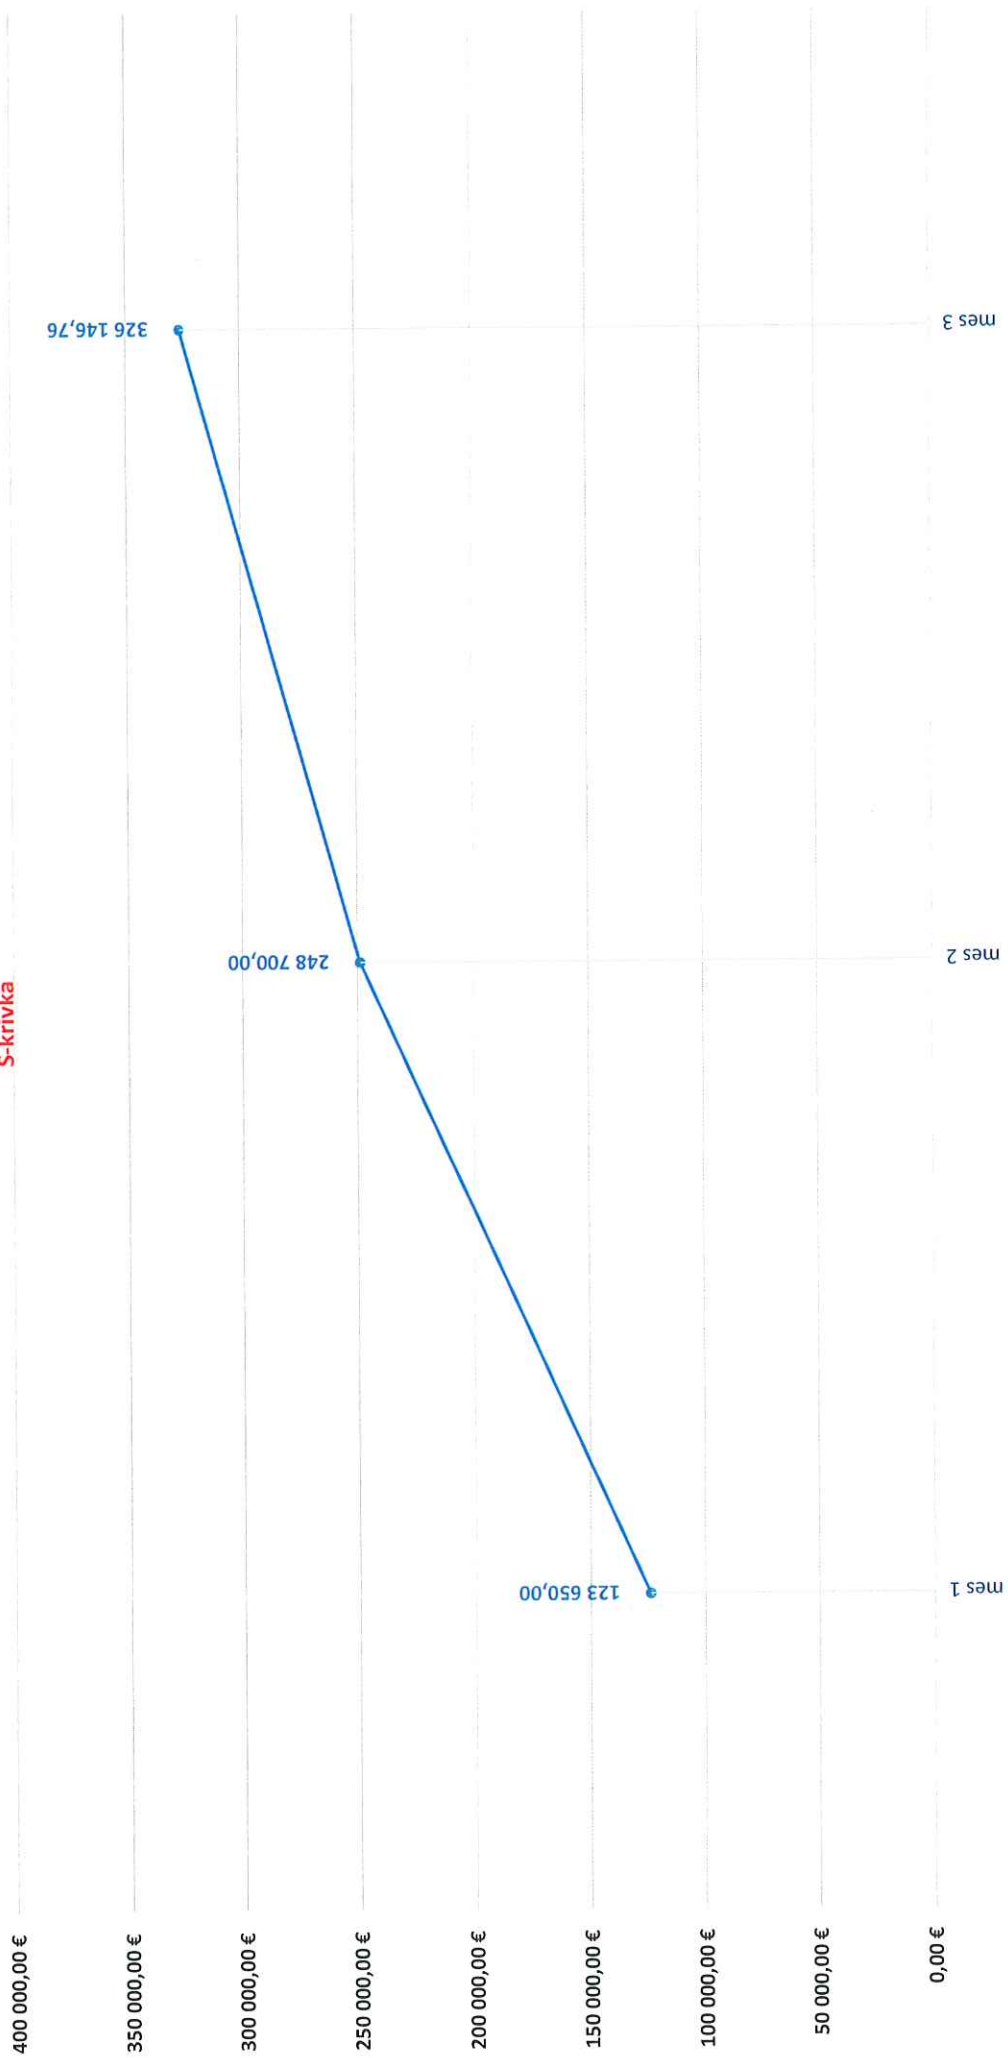

—●— PREDPOKLADANÝ FAKTURAČNÝ TOK - MESAČNÝ

PROJEKT "Kraľovany most"
Kumulatívna fakturačná krivka

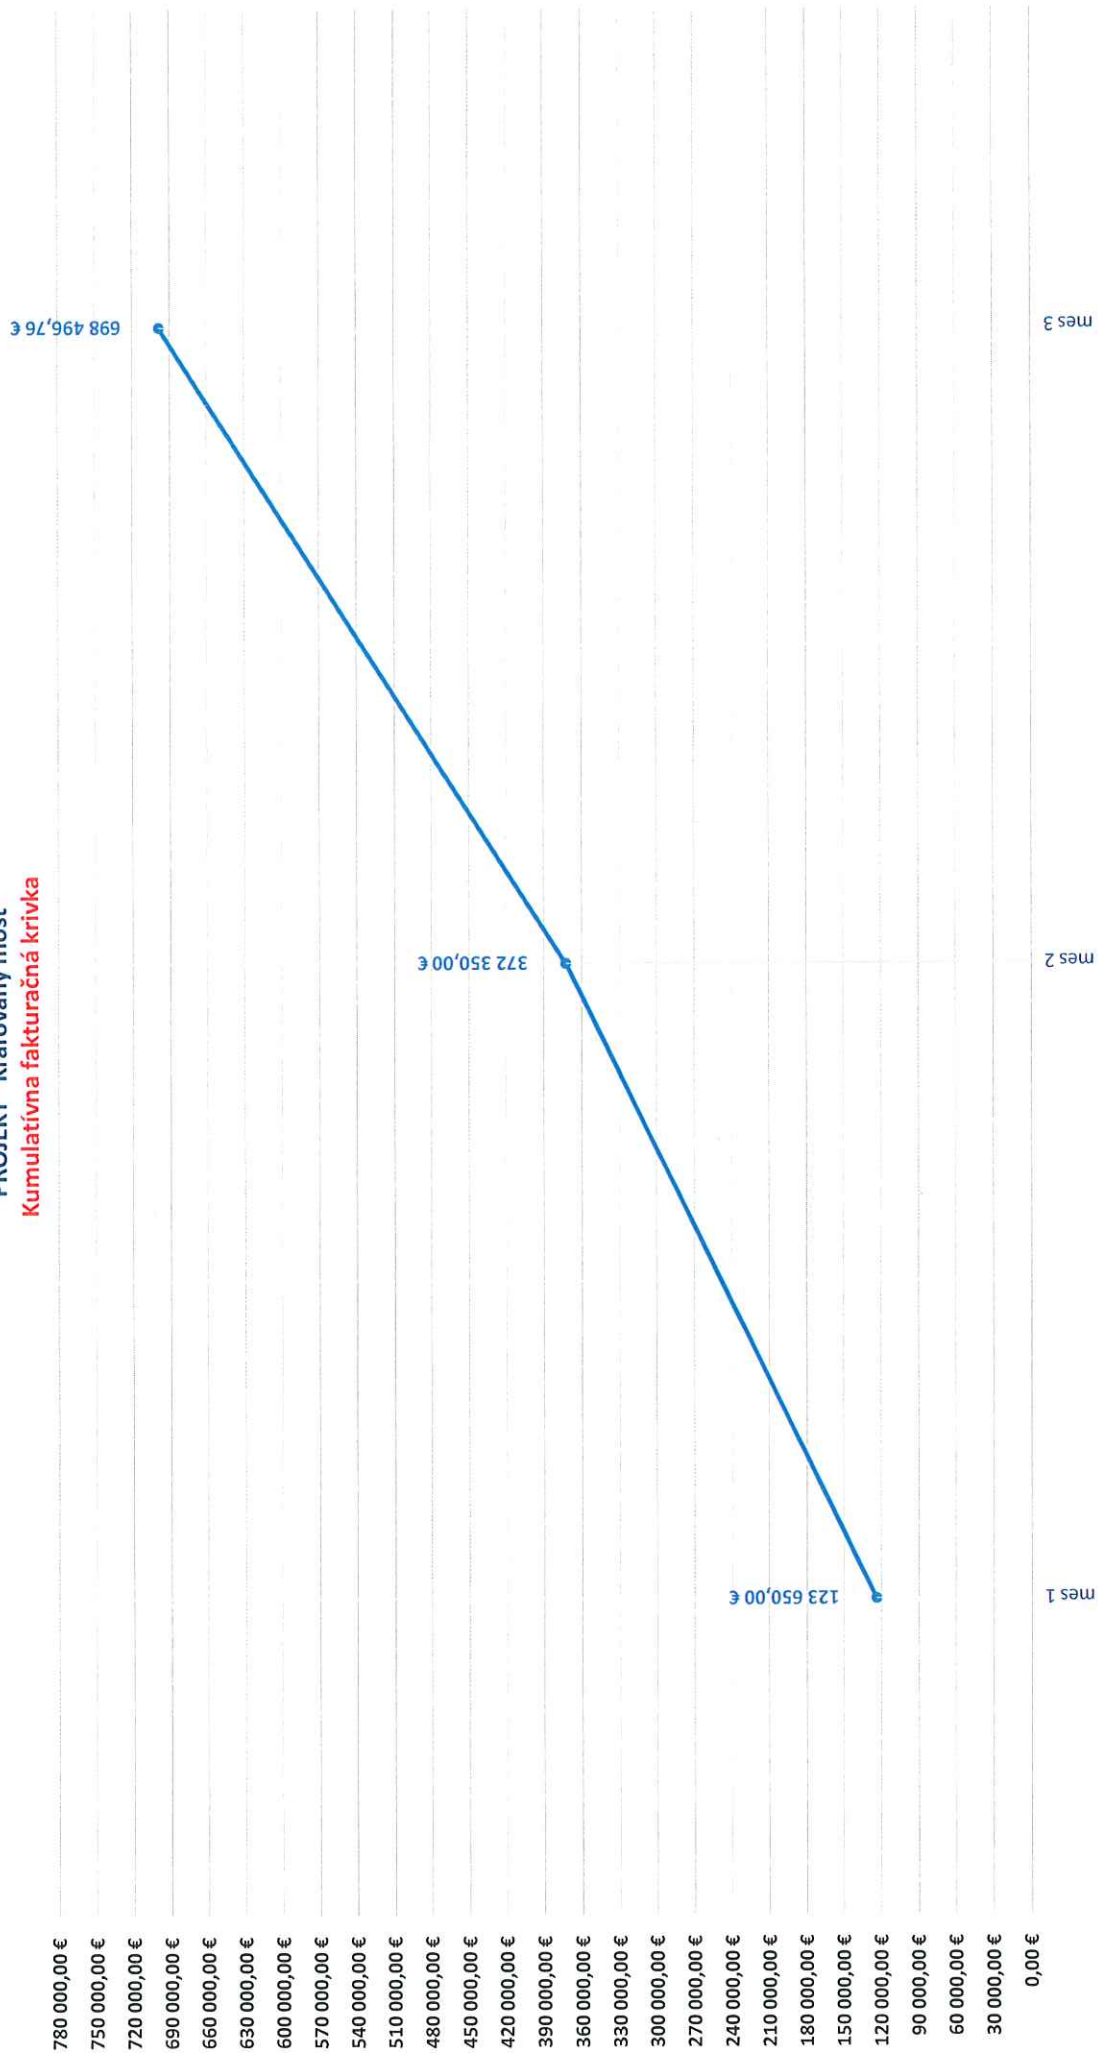

—●— PREDPOKLADANÝ FAKTURAČNÝ TOK - KUMULOVANÝ

Príloha č. 4 k Zmluvným dojednaniám - Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Podzhotoviteľov, Menovaných Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len "podzhotoviteľia"):
 - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
 - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2

Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumiejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku
ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami
ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľa)

1. Stavebník je povinný :

- a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
- b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľa – Úsek správy a prevádzky ciest IVSC Žilina:

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektu stavby (PSP), vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie projektu stavby (PSP) a realizáciu stavby (DPRSRS) a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom)

1. **NAPOMENUTIE** (porušenie povinností zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítka
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarnych zariadení a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakované (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 30,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakované
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakované (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarным zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.

Príloha č. 5 k Zmluvným dojednaniám – Protikorupčná doložka

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvná strana (ďalej len „zmluvná strana“) zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.

1.2 Zmluvná strana podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bola oboznámená s protikorupčnou politikou SSC, ktorá je zverejnená na webovom sídle SSC na adrese:

<https://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/prevencia-protispolocenskej-cinnosti.ssc>

Jej obsahu porozumela a zaväzuje sa ju rešpektovať.

2. Vyhlásenia zmluvnej strany

2.1 Zmluvná strana podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že:

- a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
- b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
- c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
- d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorú plánuje alebo už uzavrela so SSC,
- e) bezodkladne oznámi SSC akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri jeho preskúvaní,
- f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom SSC, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto zmluvy.

3. Povinnosti zmluvnej strany

3.1 Zmluvná strana sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s plnením predmetu, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to v zmysle tejto Protikorupčnej doložky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4. Ukončenie zmluvy

4.1 Túto zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v tejto Protikorupčnej doložke.
